

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/29	填表日期	111/03/29
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X : 279050.419 Y : 2754168.264
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員		
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 簡高予/業務主任	
1. 工區內因紅火蟻防治還未開工，工程區內有外來入侵種小花蔓澤蘭與銀合歡，建議可以於施工整地時一併清除。 2. 設計圖已劃定施工迴避區域，包含高草叢區域及喬木塊狀區域，設置護欄標示出保護範圍時，請標示距離樹幹約 1-1.5 公尺範圍，此外施工中可能對樹木造成傷害之重機具其使用位置至少距離樹木 1-1.5 公尺以上，並使用保護措施包覆施工便道旁的樹木。		1. 工區整地範圍內，除生態保全對象（包含台灣大豆、既有喬木等等）與區域外，其餘將在整地時一併清除整理。 2. 本案已提送生態檢核計畫，將依核定之區域圖為警示及保護，並定期空拍追蹤其生長情形。	
 		3. 上圖所標示的樹木位置被列為保全對象，因之前的過度修剪，樹木有生長不良的情形，請施工自主檢查追蹤其生長情形以及維護澆灌，若死亡請移除與補植。 座標(TWD97)X : 279329.184 Y : 2754437.452	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表


勘查日期	111/06/14	填表日期	111/06/22
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97) X : 279050.419 Y : 2754168.264
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
闕壯賢	林同棧工程顧問股份有限公司/專管人員	偕同生態勘查	
黃信錕	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司/監造人員	偕同生態勘查	
簡家宏	勁竹營造有限公司/施工人員	偕同生態勘查	

現場勘查意見

提出人員(單位/職稱)_李京樺/生態檢核調查

處理情形回覆

回覆人員(單位/職稱) 業務主任/簡高予

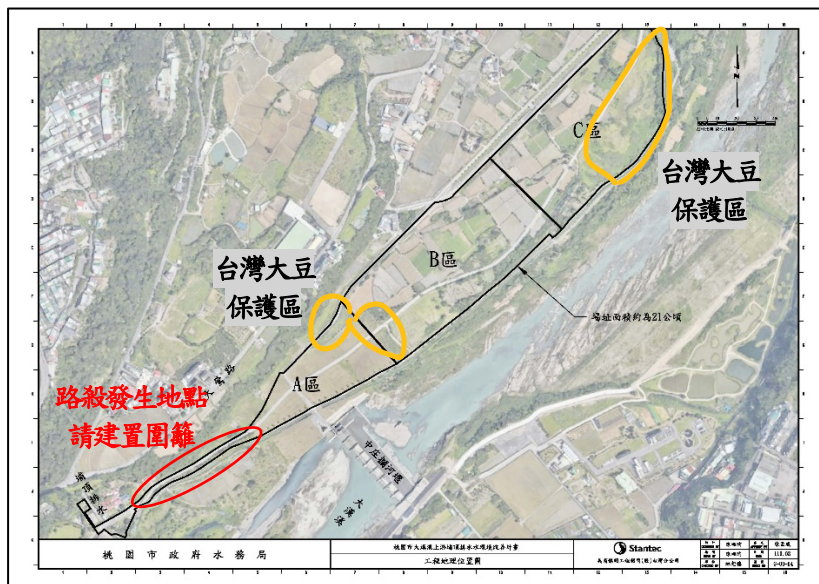

1. C區台灣大豆在設計階段已迴避，目前位在甲種圍籬外。
2. A、B區生態高敏感區已用型鋼護欄圍設區隔。
3. 人為垃圾部份加強清理。



1. 確認工區東北方C區自行車道旁有臺灣大豆生長。A區和B區的黃色範

園內目前沒發現臺灣大豆。現勘時C區尚未動工，施工前請依照設計圖在生態保全區域周圍設置鋼護欄，避免施工時意外擾動該區。




2. A區和B區黃色範圍部分區域尚未用鋼柵欄標定保留範圍，後續請依照設計圖將保留範圍四周設置鋼柵欄。
3. 工區範圍內鮮少人為廢棄物，作為值得肯定。少許人為垃圾，建請清除。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

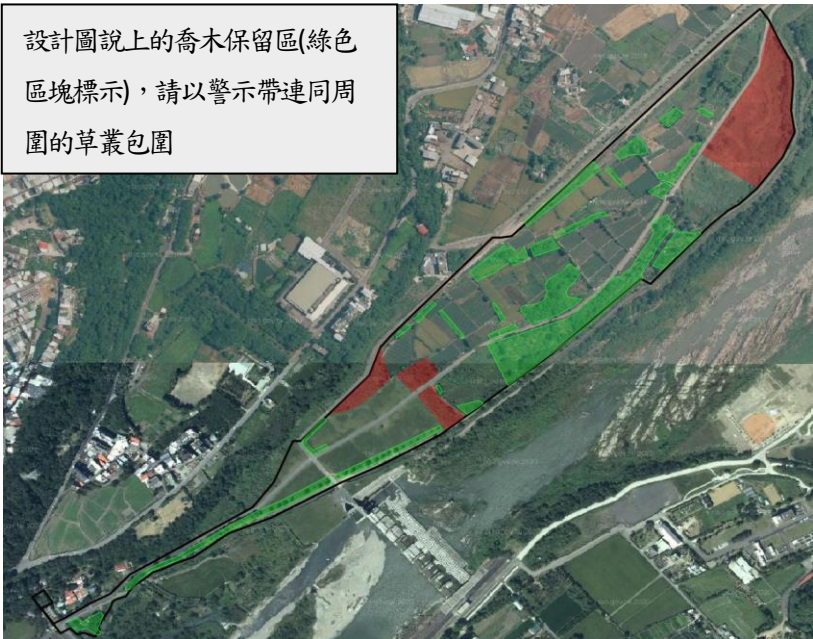勘查日期	111/07/13	填表日期	111/07/20
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97) X : 279050.419 Y : 2754168.264
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
闕壯賢	專管單位/專管工程師	陪同現勘	
黃信錕	監造單位/監造工程師	陪同現勘	
黃詳嚴	施工單位/職業安全衛生人員	陪同現勘	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安/生態檢核調查</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>業務主任/簡高予</u>	
 請以警示帶連同周圍的草叢包圍		1. 喬木保留區將隨工區施工進度進程以警示帶區塊性包圍。 2. 土方暫置位置已用防塵網覆蓋。	
設計圖說上的喬木保留區(綠色區塊標示)，請以警示帶連同周圍的草叢包圍 		1. 工區範圍觀察到家八哥、白頭翁、麻雀、洋燕、小白鷺、紅嘴黑鵯在草叢及樹木上活動，A、B 預定保護區已使用鋼柵欄包圍，建議其他設計圖說上的喬木保留區，連同周圍草叢區塊性的以警示帶包圍，不要對喬木下灌木及草叢進行除草，機具經過時避免輾壓及損傷枝幹，	

讓現有生物爬蟲類、哺乳類及鳥類有躲避空間。



2. B區目前已開始整地及挖除土方，施工車輛確實經洗車台才駛離工區，並使用灑水車清洗施工大門外路面，工區範圍未見土砂泥濘狀態，值得肯定。



3. 建議每日施工完將暫置土方覆蓋防塵網，避免土石飛散污染現地環境。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。
