



## 桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：桃園市八德區舊大湳圳排水改善工程施工前說明會
- 二、會勘時間：108年3月13日（星期三）上午10時0分
- 三、會勘地點：桃園市八德區中山路248巷246號
- 四、主持人：蘇鴻科長  
記錄：王僅堂
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會勘經過：

各單位意見如下：

蔡永芳議員：

有關人行道懸臂部分之強度安全是否可承載大卡車(10噸以上)，請顧問公司檢討，避免大車誤闖後造成步道結構損壞。

石門農田水利會小組長：

- (一)施工期間，建議分段封路，以減少當地交通衝擊。
- (二)里程0K+813既有渡槽因南側既有灌溝供水量不穩，需從舊大湳圳上游引水灌溉北側農田，建議考量新建給水路供水量，並配合下游農田高程調整新建給水路高程。
- (三)0K+680處原灌溉用水為導虹吸方式(照片2)，將灌溉用水導至馬路對岸農田，為利用取水之用，請貴局預留灌溉箱涵口(照片3)，以利水利會後續改善。
- (四)0K+747右岸及里程0K+733左岸，既有取水門尺寸僅D=40cm，有供水量不足之虞，建議新設水門尺寸調整為D=55cm(照片4~5)，過路段引水管，由水利會自行改善。
- (五)建議重新考量管理人員進行新建給水路維護作業之進出動線，如上下渠道由不銹鋼踏步改為樓梯，新增跨越水路動線等等。

地主葉文振君：

工程將會進行河道拓寬及濬深，屆時農民取水可能會受影響，請於工程施作時，將0K+733(照片4)及0K+747(照片5)既有水

門調整為 55cm，以確保灌溉用水權益。


#### 七、會勘結論：

- (一) 本局於封路前，則請承商先行張貼告示周知，並通知周邊里長廣為宣導，以利民眾瞭解封路期程、位置及替代道路。
- (二) 馬路側電杆原已立於石門農田水利會土地上(順水左岸)，將配合本工程護岸改建，遷移至順水右岸(仍為石門農田水利會土地)，以利增加路幅寬度及改善地方交通。
- (三) 新建懸臂式步道強度雖可承載車輛，但步道以人行為主，將評估設置阻隔設施，以確保人車安全。
- (四) 請崇峻工程顧問有限公司依地方意見那入評估檢討，並檢視書圖規格及內容，若須涉及書圖變更或修正，請依契約規定提送。





照片 1

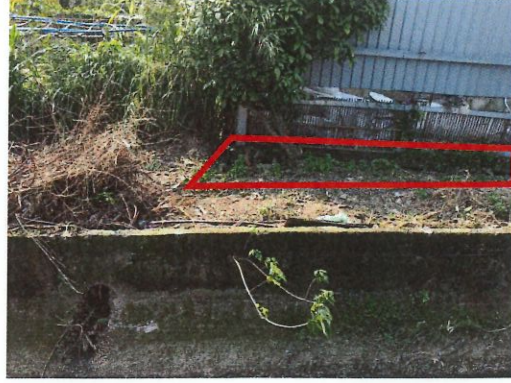

照片 2



照片 3



照片 4



照片 5





## 桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：桃園市八德區舊大滄圳排水改善工程施工前說明會
- 二、會勘時間：108年3月13日（星期三）上午/下午10時0分
- 三、會勘地點：八德區中山路248巷246號
- 四、主持人：蘇鴻科長
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	李美貞		呂林水鳳	
2	桃園市議會	議員	呂淑真	
3			蔡心芳	
4			葉印薇	
5	八德區公所	課員	徐震身	
6	石門水利會		黃耀南 彭仁宏	
7	AECOM		曹培培	
8	林申助			
9	文旺		康振發	
10	葉峻		林新 蘇柏伸	





## 桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：桃園市八德區舊大南圳排水改善工程施工前說明會
- 二、會勘時間：108年3月13日（星期三）上午/下午10時0分
- 三、會勘地點：八德區中山路248巷246號
- 四、主持人：蘇鴻科長
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	印建能			
2	葉文振			
3	水務局		王偉堯	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
